



工事名	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工	計画	0.500	(2.5)0.500		(2.5)							
	実施	0.500	(2.5)0.500		(1.2)							
土工	計画		235.000	(2.3)								
	実施		235.000	(1.6)								
	計画		250.000	(2.5)200.000		(10.8)						
	実施		450.000	(3.3)								
	計画				150.000	(1.4)						
	実施				150.000	(1.1)						
	計画				120.000	(1.3)100.000		(2.3)				
	実施				220.000	(2.0)						
護岸工	計画					360.000	(3.2)					
	実施					160.000	(2.3)200.000	(7.9)				
	計画						200.000	(1.7)120.000		(6.7)		
	実施						160.000	(2.3)160.000	(5.5)			
	計画							200.000	(1.5)			
	実施							200.000	(1.4)			
	計画							200.000	(1.7)160.000		(14.1)	
	実施							160.000	(1.3)160.000	(9.7)		
付帯工	計画	20.000	(3.0)									
	実施	20.000	(3.0)									
	計画							10.000	(0.6)10.000		(6.3)	
	実施							10.000	(0.6)10.000	(3.5)		
仮設工	計画		0.300	(0.1)0.300		(0.6)0.300		(0.2)0.100		(0.3)		
	実施		0.400	(0.1)0.200		(0.2)0.200		(0.2)0.200		(0.5)		
後片付け	計画									1.000	(0.4)	
	実施									1.000	(0.3)	
	計画											
	実施											

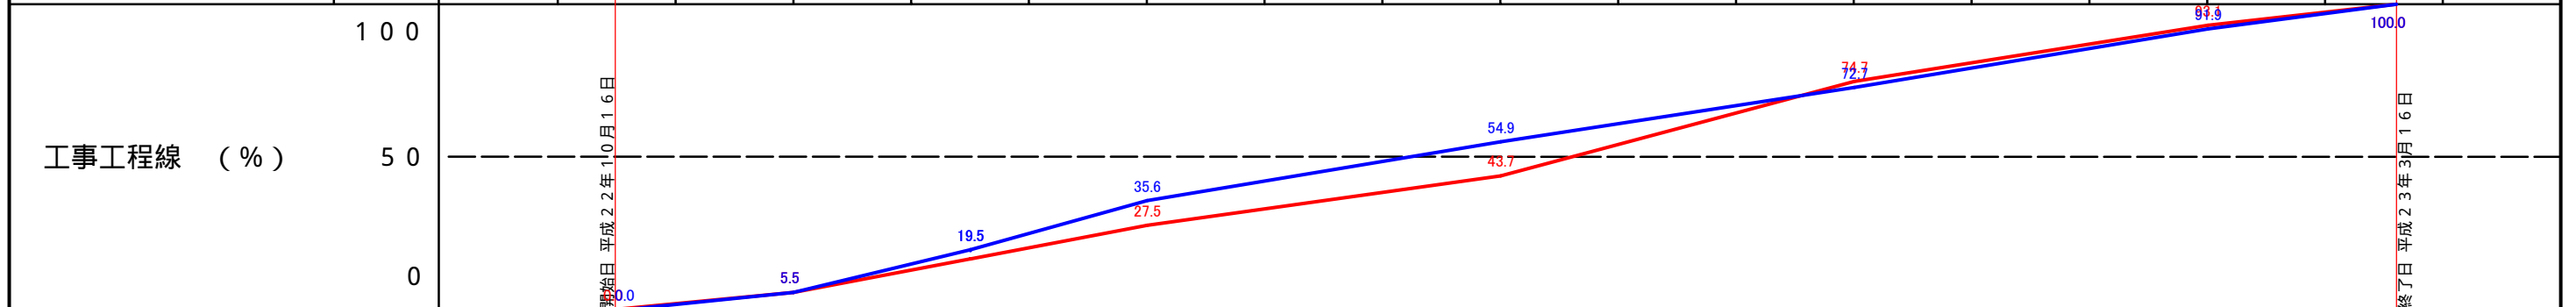


摘要	工事概要 準備工 1.000式 450.000m <sup>3</sup> 220.000m <sup>3</sup> 320.000m <sup>2</sup> 360.000枚 20.000m 後片付け 1.000式	請負金額 50,000,000円 上記工程で施工しましたから提出します。 関東地方整備局	平成23年5月10日 (請負人) 住所 山梨県南アルプス市 氏名 WF 土木市郎
----	---	--	--

工事名		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工	当初	0.500	(2.5)0.500		(2.5)								
	変更	0.500	(2.5)0.500		(2.8)								
土工	当初		235.000		(2.3)								
	変更		235.000		(2.8)								
	当初		250.000		(2.5)200.000		(10.8)						
	変更		250.000		(2.5)200.000		(10.8)						
	当初				150.000		(1.4)						
	変更				150.000		(1.4)						
	当初				120.000		(1.3)100.000		(2.3)				
	変更				220.000		(2.8)100.000		(2.3)				
護岸工	当初						360.000		(3.2)				
	変更						160.000		(2.3)360.000		(2.9)		
	当初						200.000		(1.7)20.000		(6.7)		
	変更						280.000		(2.2)160.000		(6.8)		
	当初								200.000		(1.5)		
	変更								200.000		(1.8)		
	当初								200.000		(1.7)160.000		(14.1)
	変更								280.000		(1.2)160.000		(18.7)
付帯工	当初	20.000	(3.0)										
	変更	20.000	(3.0)										
	当初								10.000		(0.6)10.000		(6.3)
	変更								10.000		(0.6)10.000		(6.5)
仮設工	当初		0.300		(0.1)0.300		(0.6)0.300		(0.2)0.100		(0.3)		
	変更		0.300		(0.1)0.200		(0.8)0.200		(0.2)0.200		(0.8)		
後片付け	当初										1.000		(0.4)
	変更										1.000		(0.3)
	当初												
	変更												

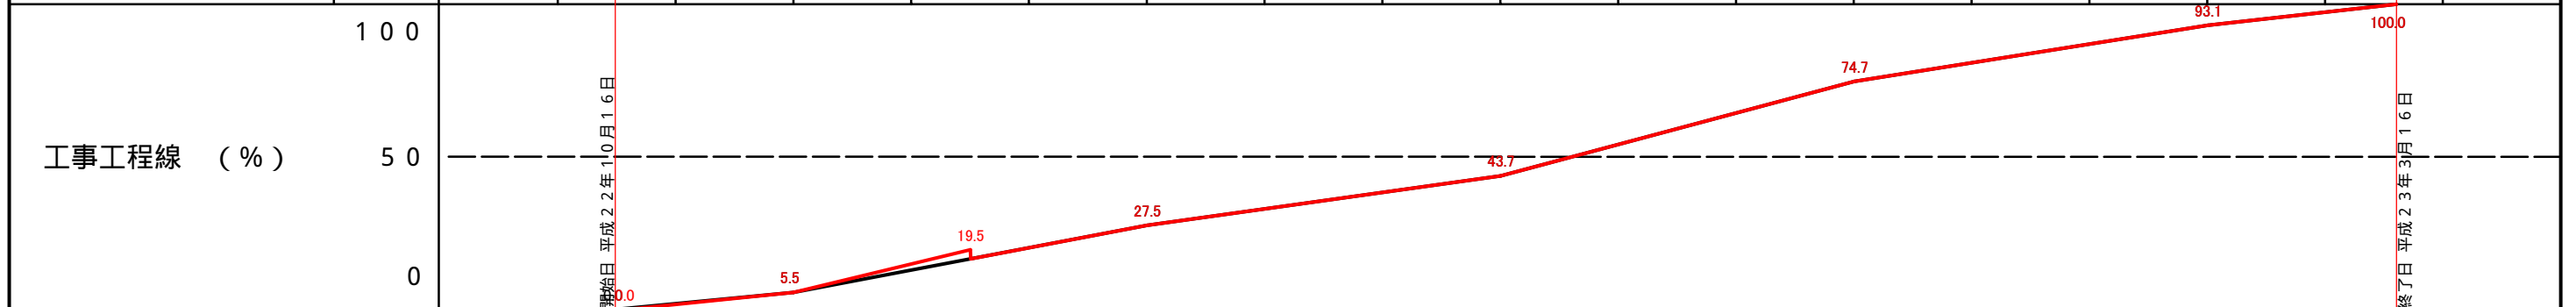

摘要	工事概要 準備工 1.000式 450.000m <sup>3</sup> 220.000m <sup>3</sup> 320.000m <sup>2</sup> 360.000枚 20.000m 後片付け 1.000式	請負金額 50,000,000 円 土工 235.000m <sup>3</sup> 150.000m <sup>2</sup> 護岸工 360.000枚 200.000m <sup>2</sup> 付帯工 20.000m 仮設工 1.000式	上記工程で施工しますから提出します。 関東地方整備局 平成23年 5月10日	(請負人) 住所 山梨県南アルプス市 氏名 WF 土木市郎
----	---	--	--	----------------------------------

工事名	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工	計画	0.500	(2.5)	0.500	(2.5)							
	実施											
土工	計画		235.000	(2.3)								
	実施											
	計画		250.000	(2.5)	200.000	(10.8)						
	実施											
	計画				150.000	(1.4)						
	実施											
	計画				120.000	(1.3)	100.000	(2.3)				
	実施											
護岸工	計画					360.000	(3.2)					
	実施											
	計画					200.000	(1.7)	20.000	(6.7)			
	実施											
	計画							200.000	(1.5)			
	実施											
	計画							200.000	(1.7)	60.000	(14.1)	
	実施											
付帯工	計画	20.000	(3.0)									
	実施											
	計画							10.000	(0.6)	60.000	(6.3)	
	実施											
仮設工	計画		0.300	(0.1)	0.300	(0.6)	0.300	(0.2)	0.100	(0.3)		
	実施											
後片付け	計画									1.000	(0.4)	
	実施											
	計画											
	実施											

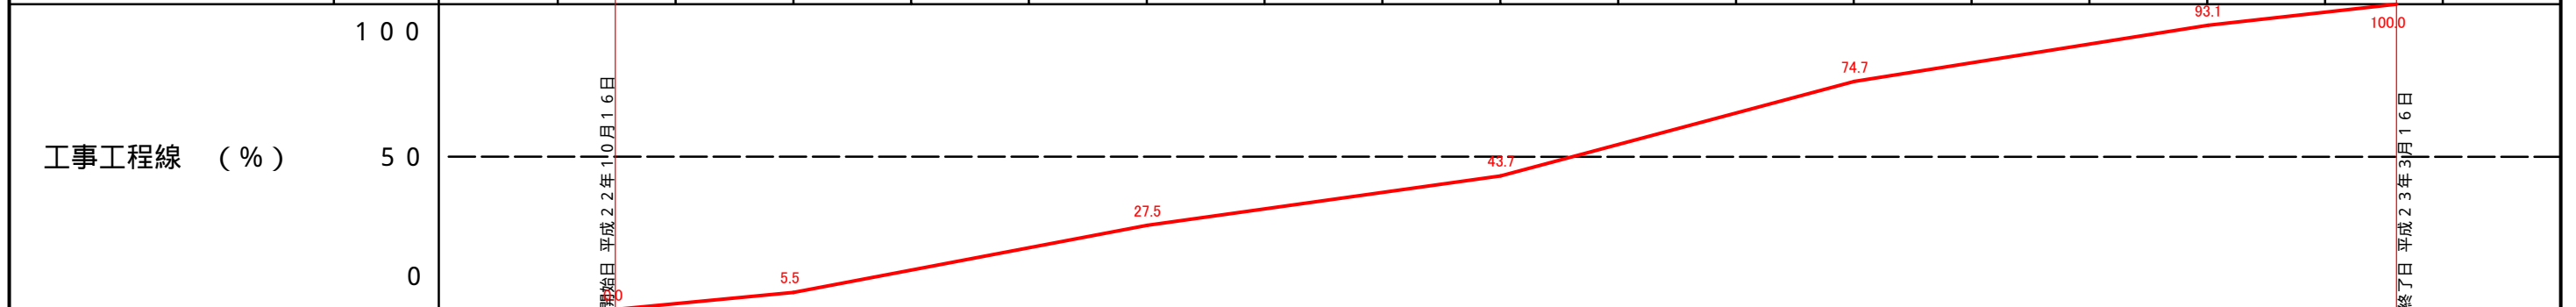

摘要	工事概要 準備工 1.000式 450.000m <sup>3</sup> 220.000m <sup>3</sup> 320.000m <sup>2</sup> 360.000枚 20.000m 後片付け 1.000式	請負金額 50,000,000円 土工 235.000m <sup>3</sup> 150.000m <sup>2</sup> 護岸工 360.000枚 200.000m <sup>2</sup> 付帯工 20.000m 仮設工 1.000式	上記工程で施工しますから提出します。  関東地方整備局  (請負人) 住所 山梨県南アルプス市 氏名 WF 土木市郎	平成23年 5月10日
----	---	---	---	-------------
